

Port
Polska

Projekt "Budowa linii kolejowej Katowice – Ostrawa na odcinku Katowice – granica państwa".

Status projektu

Wodzisław Śląski, 23 kwiecień 2026 r.



07 2025


Przyznanie dofinansowania
UE na wykonanie prac
projektowych (CEF)



18 356 600 eur

1. Zgodnie z ustaleniami z 03 2025 projekt CPK rozpoczyna się od wypięcia z linii kolejowej nr 140 za stacją Mikołów
2. Projekt kończy się na moście granicznym przez Olzę (gmina Godów)
3. Projekt obejmuje powstanie łącznicy do Jastrzębia – Zdroju ze stacją Jastrzębie – Zdrój Centrum i przystankiem Jastrzębie – Zdrój Zachód



Łącznica z Wodzisławia
Śląskiego do Jastrzębia - Zdroju
wg ukończonej Koncepcji
Programowo - Przestrzennej

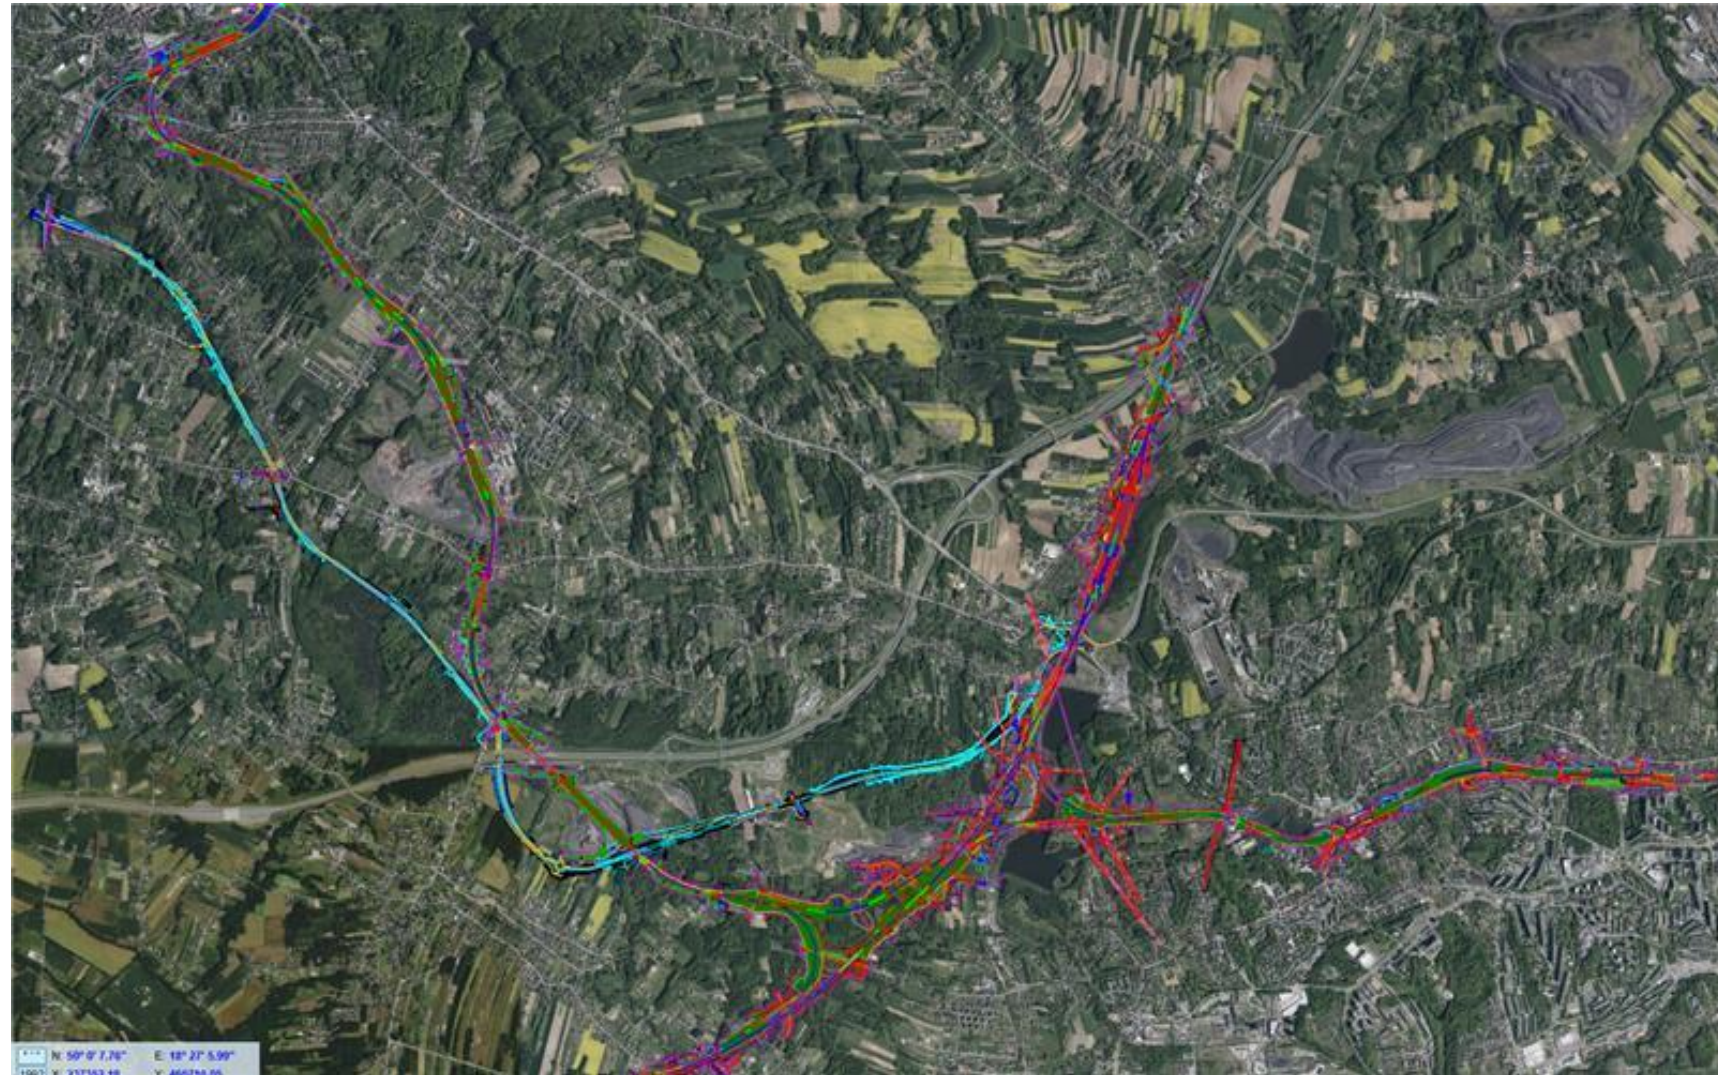

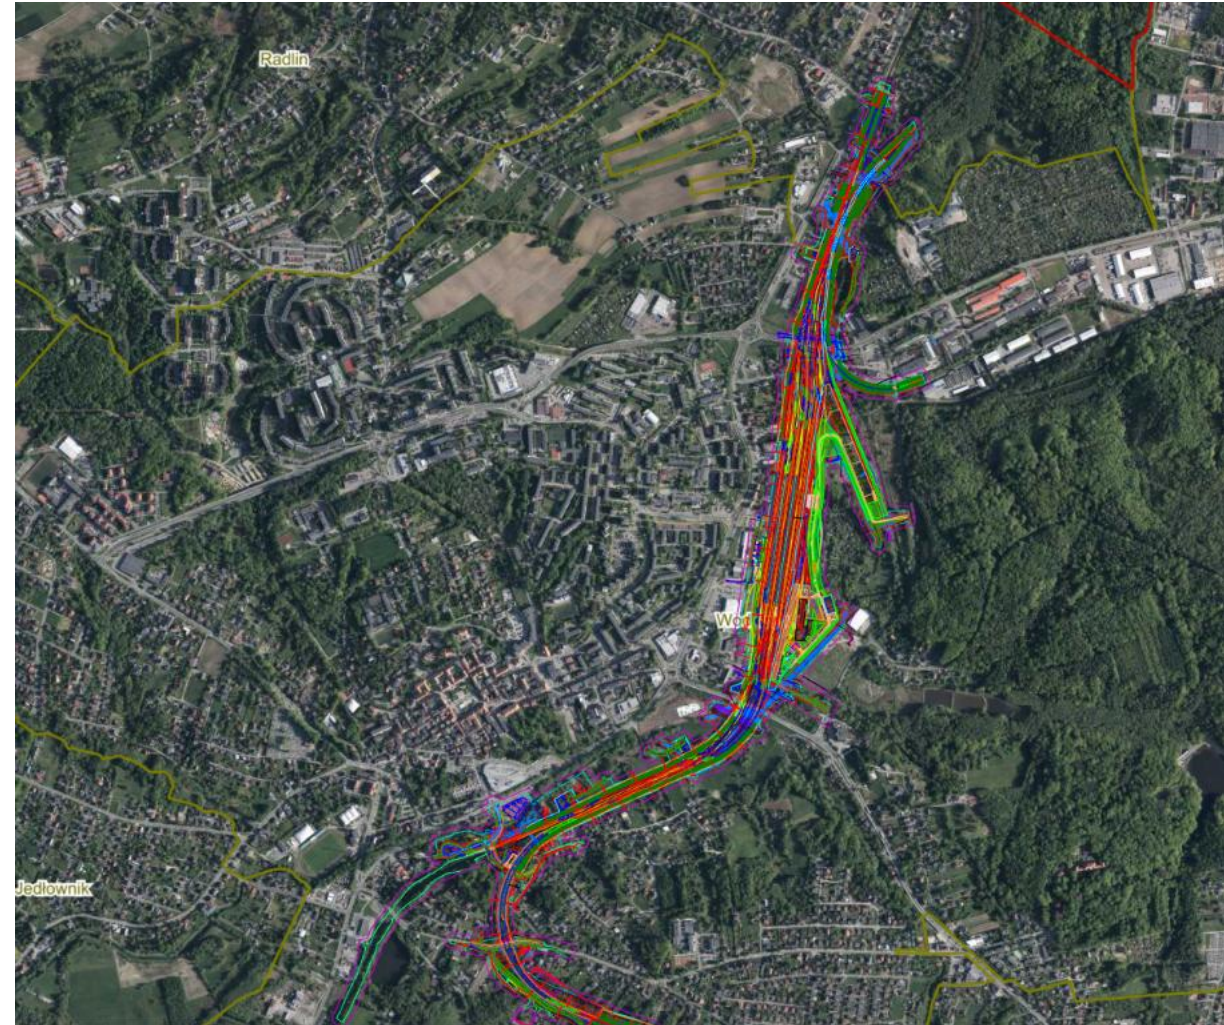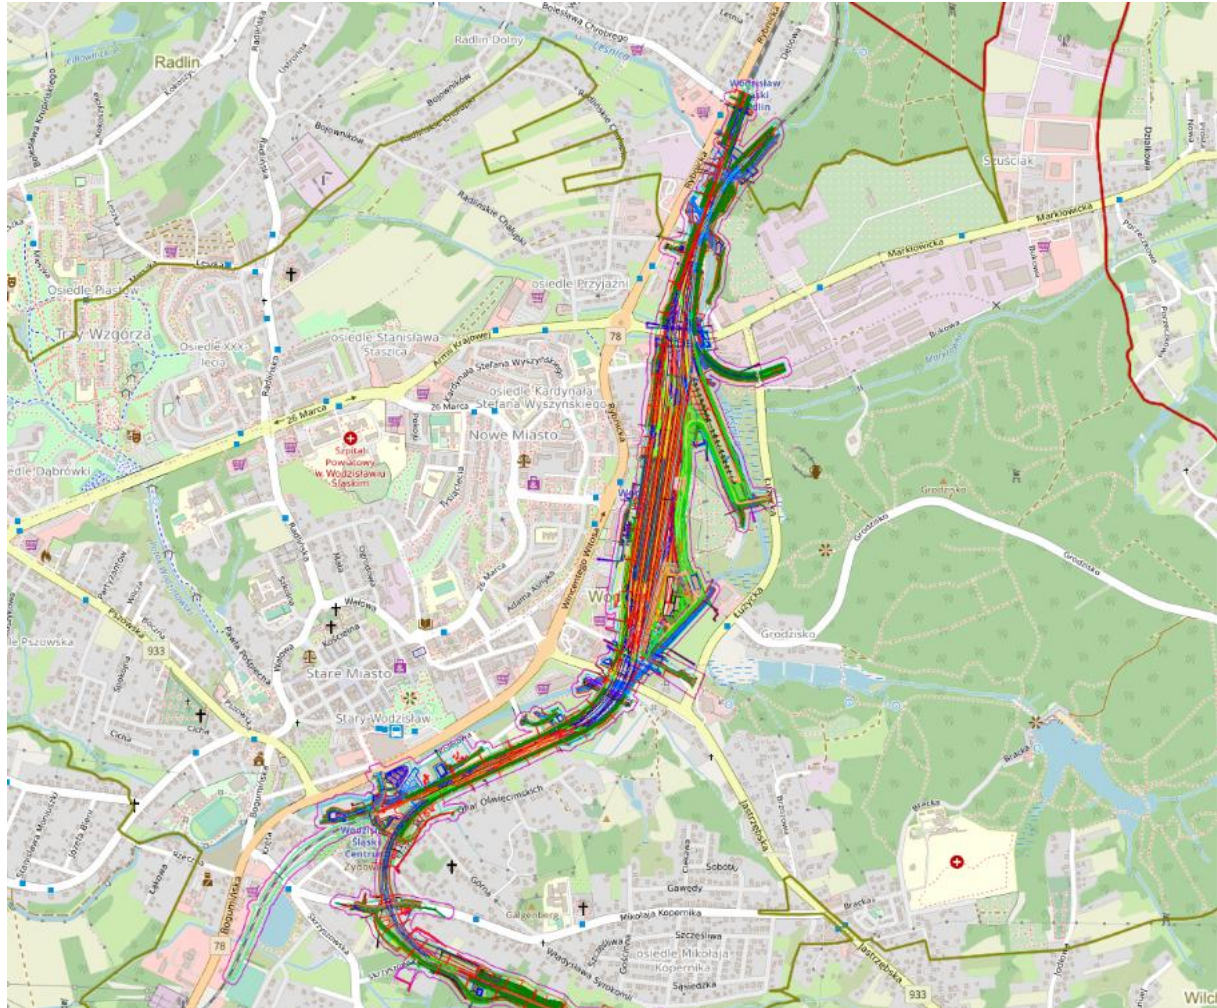

2. Umowy na projektowanie odcinka po stronie czeskiej:

- **07 2025** - podpisanie umowy przez Sprava Zeleznic ze Wykonawcą – Moravia Consult o wartości 217 999 000 koron.
- Nowa linia kolejowa w miejscowości Dolní Lutyni odłączy się od istniejącego korytarza kolejowego i poprowadzi aż do granicy państwowej, którą przekroczy po estakadzie nad rzeką Olzą. Projekt obejmuje również zwiększenie przepustowości odcinka między Ostrawą a Bohumínem, dzięki czemu linia płynnie połączy się z już przygotowywanym połączeniem dużych prędkości z Pragi do Ostrawy.
- Zamówienie obejmuje: uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach, wykonanie Koncepcji oraz Projektu Budowlanego - do uzyskania Zezwolenia na Budowę.

UZYSKANIE Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)	Szacowany termin uzyskania DŚU:	31.12.2026
	Rozpoczęcie:	Zakończenie:
ETAP 1 - ODCINEK HH - HZ - ZZ - HO (zakres objęty GA-2)	18.02.2026	14.12.2028
W tym, w zakresie odcinka HZ realizowany jest most graniczny:		
Projekt Zagospodarowanie Terenu	18.02.2026	04.09.2026
Projekt Architektoniczno-Budowlany	04.09.2026	23.11.2026
Projekt Techniczny	18.02.2026	04.09.2026
Złożenie wniosku o Pozwolenie na Budowę		15.06.2028
Uzyskanie ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę		14.12.2028
Uzyskanie decyzji o ULLK (rygor natychmiastowej wykonalności / ostateczność)		01.06.2028
ETAP 2 - ODCINEK AE - EE - EG - GG (część)	18.02.2026	14.02.2029
ETAP 3 - ODCINEK GG (część) - GH	18.02.2026	14.02.2029
ETAP 4a - ODCINEK AA	01.09.2027	18.11.2030
ETAP 4b - ODCINEK HU	31.05.2027	18.11.2030
